Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de La Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property
Einsteinstrasse 2 - CH-3003 Bern

B32.03 - eDossier-Interceptions
Diplomarbeit an der Software-Schule Schweiz
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Anita Rüegsegger und Marc Bouquet

Nr.	Vorgangsname	Arbeit	Anfang	Ende
1	**Projekt eDossier**	**600 Std.**	**Mit 09.06.04**	**Fre 19.11.04**
2	Start	0 Std.	Mit 09.06.04	Mit 09.06.04
3	**Voranalyse**	**128 Std.**	**Mit 09.06.04**	**Don 19.08.04**
4	Projektplan erstellen	16 Std.	Mit 09.06.04	Mit 09.06.04
5	**Pflichtenheft**	**80 Std.**	**Mit 16.06.04**	**Mit 30.06.04**
6	Prozesse mit Kunde definieren	16 Std.	Mit 16.06.04	Mit 16.06.04
7	Detailziele formulieren und gewichten	32 Std.	Fre 18.06.04	Mit 23.06.04
8	Dokument erstellen	32 Std.	Fre 25.06.04	Mit 30.06.04
9	Review Pflichtenheft, Projektplan mit Betreuer	0 Std.	Fre 02.07.04	Fre 02.07.04
10	Review Pflichtenheft, Projektplan mit Experte	0 Std.	Mit 07.07.04	Mit 07.07.04
11	Bereinigung des Pflichtenhefts und Projektplan	32 Std.	Mit 07.07.04	Mit 07.07.04
12	Abgabe Pflichtenheft	0 Std.	Don 19.08.04	Don 19.08.04
13	**Analyse/Design**	**192 Std.**	**Fre 02.07.04**	**Mit 01.09.04**
14	Use-Cases definieren	32 Std.	Fre 02.07.04	Mit 07.07.04
15	Datenbank Design ERD / RDM	32 Std.	Fre 09.07.04	Mit 14.07.04
16	DB- , SQL-Skripte erstellen, Testdaten erfassen	48 Std.	Fre 16.07.04	Fre 13.08.04
17	UML-Diagramm erstellen	48 Std.	Mit 18.08.04	Mit 25.08.04
18	Prototyp	32 Std.	Fre 27.08.04	Mit 01.09.04
19	Review Analyse/Design, Prototyp mit Betreuer, Kunde	0 Std.	Mit 01.09.04	Mit 01.09.04
20	**Implementation / Tests**	**248 Std.**	**Fre 03.09.04**	**Mit 10.11.04**
21	**1. Prio Muss-Ziele**	**112 Std.**	**Fre 03.09.04**	**Fre 24.09.04**
22	Datenbankzugriffe implementieren	16 Std.	Fre 03.09.04	Mit 08.09.04
23	[M1] Login (Authentifizierung)	16 Std.	Fre 03.09.04	Mit 08.09.04
24	[M2] Logout	8 Std.	Fre 10.09.04	Fre 10.09.04
25	[M3] Ansicht Dossier	16 Std.	Fre 10.09.04	Mit 15.09.04
26	[M4] Detail Dossier	16 Std.	Fre 17.09.04	Mit 22.09.04
27	[M5] Beanstandungen bearbeiten	16 Std.	Mit 15.09.04	Fre 17.09.04
28	[M6] Ansicht Antworten	8 Std.	Mit 22.09.04	Mit 22.09.04
29	Tests	16 Std.	Fre 24.09.04	Fre 24.09.04
30	Review mit Betreuer / Kunde	0 Std.	Fre 24.09.04	Fre 24.09.04
31	**2. Prio Kann-Ziele**	**88 Std.**	**Mit 13.10.04**	**Fre 29.10.04**
32	[K1] Ansicht Pdf	16 Std.	Mit 13.10.04	Fre 15.10.04
33	[K2] Beanstandungen Fristen	8 Std.	Mit 20.10.04	Mit 20.10.04
34	[K3] Beanstandungen Status	12 Std.	Fre 22.10.04	Mit 27.10.04
35	[K4] Mailversand Markenprüfer	8 Std.	Mit 13.10.04	Mit 13.10.04
36	[K5] Passwort vergessen	4 Std.	Fre 15.10.04	Fre 15.10.04
37	[K6] Attachement	8 Std.	Fre 15.10.04	Mit 20.10.04
38	[K7] Newsletter New	16 Std.	Mit 20.10.04	Mit 27.10.04
39	Tests	16 Std.	Mit 27.10.04	Fre 29.10.04
40	Review mit Betreuer / Kunde	0 Std.	Fre 29.10.04	Fre 29.10.04
41	**3. Nice-to-have Ziele**	**48 Std.**	**Fre 29.10.04**	**Mit 10.11.04**
42	[N1] Suche	16 Std.	Fre 29.10.04	Fre 05.11.04
43	[N2] Korrekturvorschläge	16 Std.	Fre 29.10.04	Fre 05.11.04
44	Tests	16 Std.	Fre 05.11.04	Mit 10.11.04
45	Review mit Betreuer / Kunde	0 Std.	Mit 10.11.04	Mit 10.11.04
46	**Abschluss**	**32 Std.**	**Mit 10.11.04**	**Fre 19.11.04**
47	Demonstration Applikation (Expertin und Betreuer)	0 Std.	Fre 12.11.04	Fre 12.11.04
48	Diplombericht fertigstellen	16 Std.	Mit 10.11.04	Fre 12.11.04
49	Abgabe Diplombericht an Betreuer	0 Std.	Mon 15.11.04	Mon 15.11.04
50	Bereiningung Diplombericht	16 Std.	Mon 15.11.04	Mon 15.11.04
51	Abgabe Diplomarbeit, Betreuerbeurteilung, Zusammenfassung	0 Std.	Don 18.11.04	Don 18.11.04
52	Präsentation Diplomarbeit	0 Std.	Fre 19.11.04	Fre 19.11.04
53	Ende	0 Std.	Fre 19.11.04	Fre 19.11.04

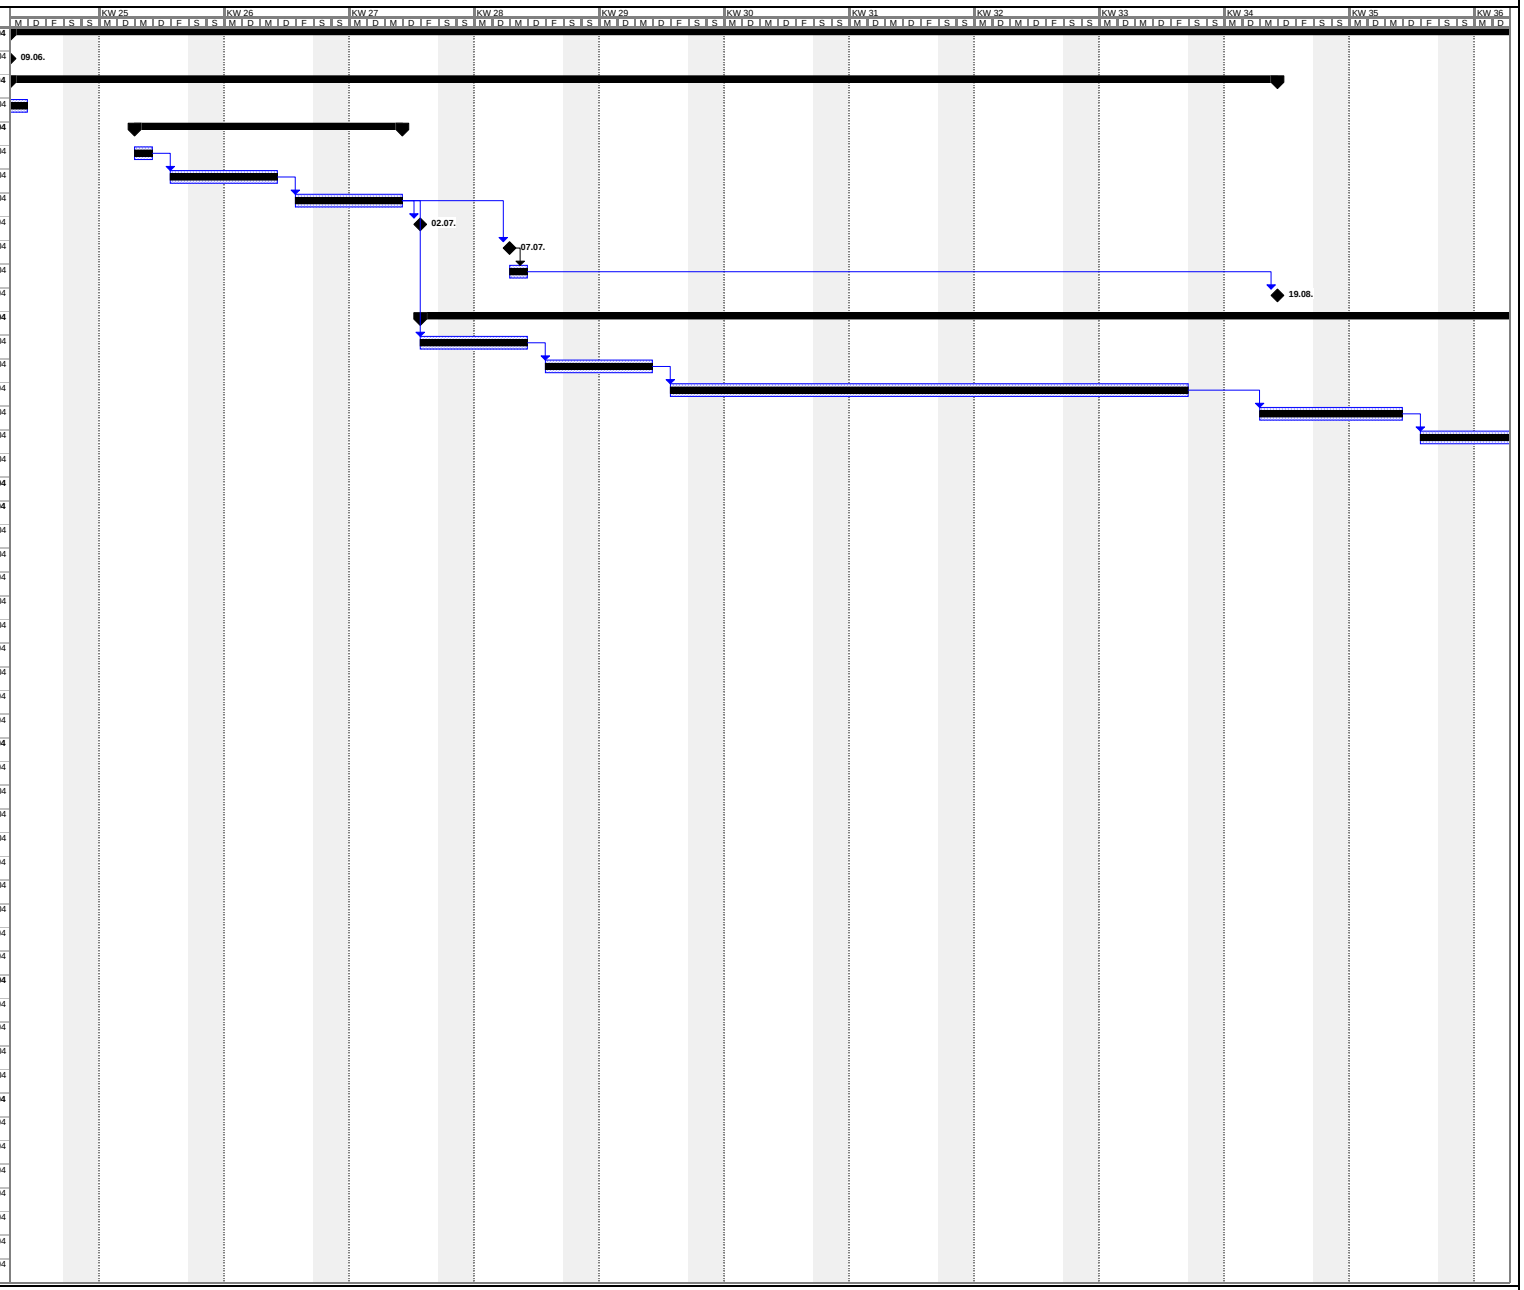

Projekt: eDossier
Datum: Mon 15.11.04

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag

Nr.	Vorgangsname	Arbeit	Anfang	Ende
1	**Projekt eDossier**	**600 Std.**	**Mit 09.06.04**	**Fre 19.11.04**
2	Start	0 Std.	Mit 09.06.04	Mit 09.06.04
3	**Voranalyse**	**128 Std.**	**Mit 09.06.04**	**Don 19.08.04**
4	Projektplan erstellen	16 Std.	Mit 09.06.04	Mit 09.06.04
5	**Pflichtenheft**	**80 Std.**	**Mit 16.06.04**	**Mit 30.06.04**
6	Prozesse mit Kunde definieren	16 Std.	Mit 16.06.04	Mit 16.06.04
7	Detailziele formulieren und gewichten	32 Std.	Fre 18.06.04	Mit 23.06.04
8	Dokument erstellen	32 Std.	Fre 25.06.04	Mit 30.06.04
9	Review Pflichtenheft, Projektplan mit Betreuer	0 Std.	Fre 02.07.04	Fre 02.07.04
10	Review Pflichtenheft, Projektplan mit Experte	0 Std.	Mit 07.07.04	Mit 07.07.04
11	Bereinigung des Pflichtenhefts und Projektplan	32 Std.	Mit 07.07.04	Mit 07.07.04
12	Abgabe Pflichtenheft	0 Std.	Don 19.08.04	Don 19.08.04
13	**Analyse/Design**	**192 Std.**	**Fre 02.07.04**	**Mit 01.09.04**
14	Use-Cases definieren	32 Std.	Fre 02.07.04	Mit 07.07.04
15	Datenbank Design ERD / RDM	32 Std.	Fre 09.07.04	Mit 14.07.04
16	DB- , SQL-Skripte erstellen, Testdaten erfassen	48 Std.	Fre 16.07.04	Fre 13.08.04
17	UML-Diagramm erstellen	48 Std.	Mit 18.08.04	Mit 25.08.04
18	Prototyp	32 Std.	Fre 27.08.04	Mit 01.09.04
19	Review Analyse/Design, Prototyp mit Betreuer, Kunde	0 Std.	Mit 01.09.04	Mit 01.09.04
20	**Implementation / Tests**	**248 Std.**	**Fre 03.09.04**	**Mit 10.11.04**
21	**1. Prio Muss-Ziele**	**112 Std.**	**Fre 03.09.04**	**Fre 24.09.04**
22	Datenbankzugriffe implementieren	16 Std.	Fre 03.09.04	Mit 08.09.04
23	[M1] Login (Authentifizierung)	16 Std.	Fre 03.09.04	Mit 08.09.04
24	[M2] Logout	8 Std.	Fre 10.09.04	Fre 10.09.04
25	[M3] Ansicht Dossier	16 Std.	Fre 10.09.04	Mit 15.09.04
26	[M4] Detail Dossier	16 Std.	Fre 17.09.04	Mit 22.09.04
27	[M5] Beanstandungen bearbeiten	16 Std.	Mit 15.09.04	Fre 17.09.04
28	[M6] Ansicht Antworten	8 Std.	Mit 22.09.04	Mit 22.09.04
29	Tests	16 Std.	Fre 24.09.04	Fre 24.09.04
30	Review mit Betreuer / Kunde	0 Std.	Fre 24.09.04	Fre 24.09.04
31	**2. Prio Kann-Ziele**	**88 Std.**	**Mit 13.10.04**	**Fre 29.10.04**
32	[K1] Ansicht Pdf	16 Std.	Mit 13.10.04	Fre 15.10.04
33	[K2] Beanstandungen Fristen	8 Std.	Mit 20.10.04	Mit 20.10.04
34	[K3] Beanstandungen Status	12 Std.	Fre 22.10.04	Mit 27.10.04
35	[K4] Mailversand Markenprüfer	8 Std.	Mit 13.10.04	Mit 13.10.04
36	[K5] Passwort vergessen	4 Std.	Fre 15.10.04	Fre 15.10.04
37	[K6] Attachement	8 Std.	Fre 15.10.04	Mit 20.10.04
38	[K7] Newsletter New	16 Std.	Mit 20.10.04	Mit 27.10.04
39	Tests	16 Std.	Mit 27.10.04	Fre 29.10.04
40	Review mit Betreuer / Kunde	0 Std.	Fre 29.10.04	Fre 29.10.04
41	**3. Nice-to-have Ziele**	**48 Std.**	**Fre 29.10.04**	**Mit 10.11.04**
42	[N1] Suche	16 Std.	Fre 29.10.04	Fre 05.11.04
43	[N2] Korrekturvorschläge	16 Std.	Fre 29.10.04	Fre 05.11.04
44	Tests	16 Std.	Fre 05.11.04	Mit 10.11.04
45	Review mit Betreuer / Kunde	0 Std.	Mit 10.11.04	Mit 10.11.04
46	**Abschluss**	**32 Std.**	**Mit 10.11.04**	**Fre 19.11.04**
47	Demonstration Applikation (Expertin und Betreuer)	0 Std.	Fre 12.11.04	Fre 12.11.04
48	Diplombericht fertigstellen	16 Std.	Mit 10.11.04	Fre 12.11.04
49	Abgabe Diplombericht an Betreuer	0 Std.	Mon 15.11.04	Mon 15.11.04
50	Bereiningung Diplombericht	16 Std.	Mon 15.11.04	Mon 15.11.04
51	Abgabe Diplomarbeit, Betreuerbeurteilung, Zusammenfassung	0 Std.	Don 18.11.04	Don 18.11.04
52	Präsentation Diplomarbeit	0 Std.	Fre 19.11.04	Fre 19.11.04
53	Ende	0 Std.	Fre 19.11.04	Fre 19.11.04

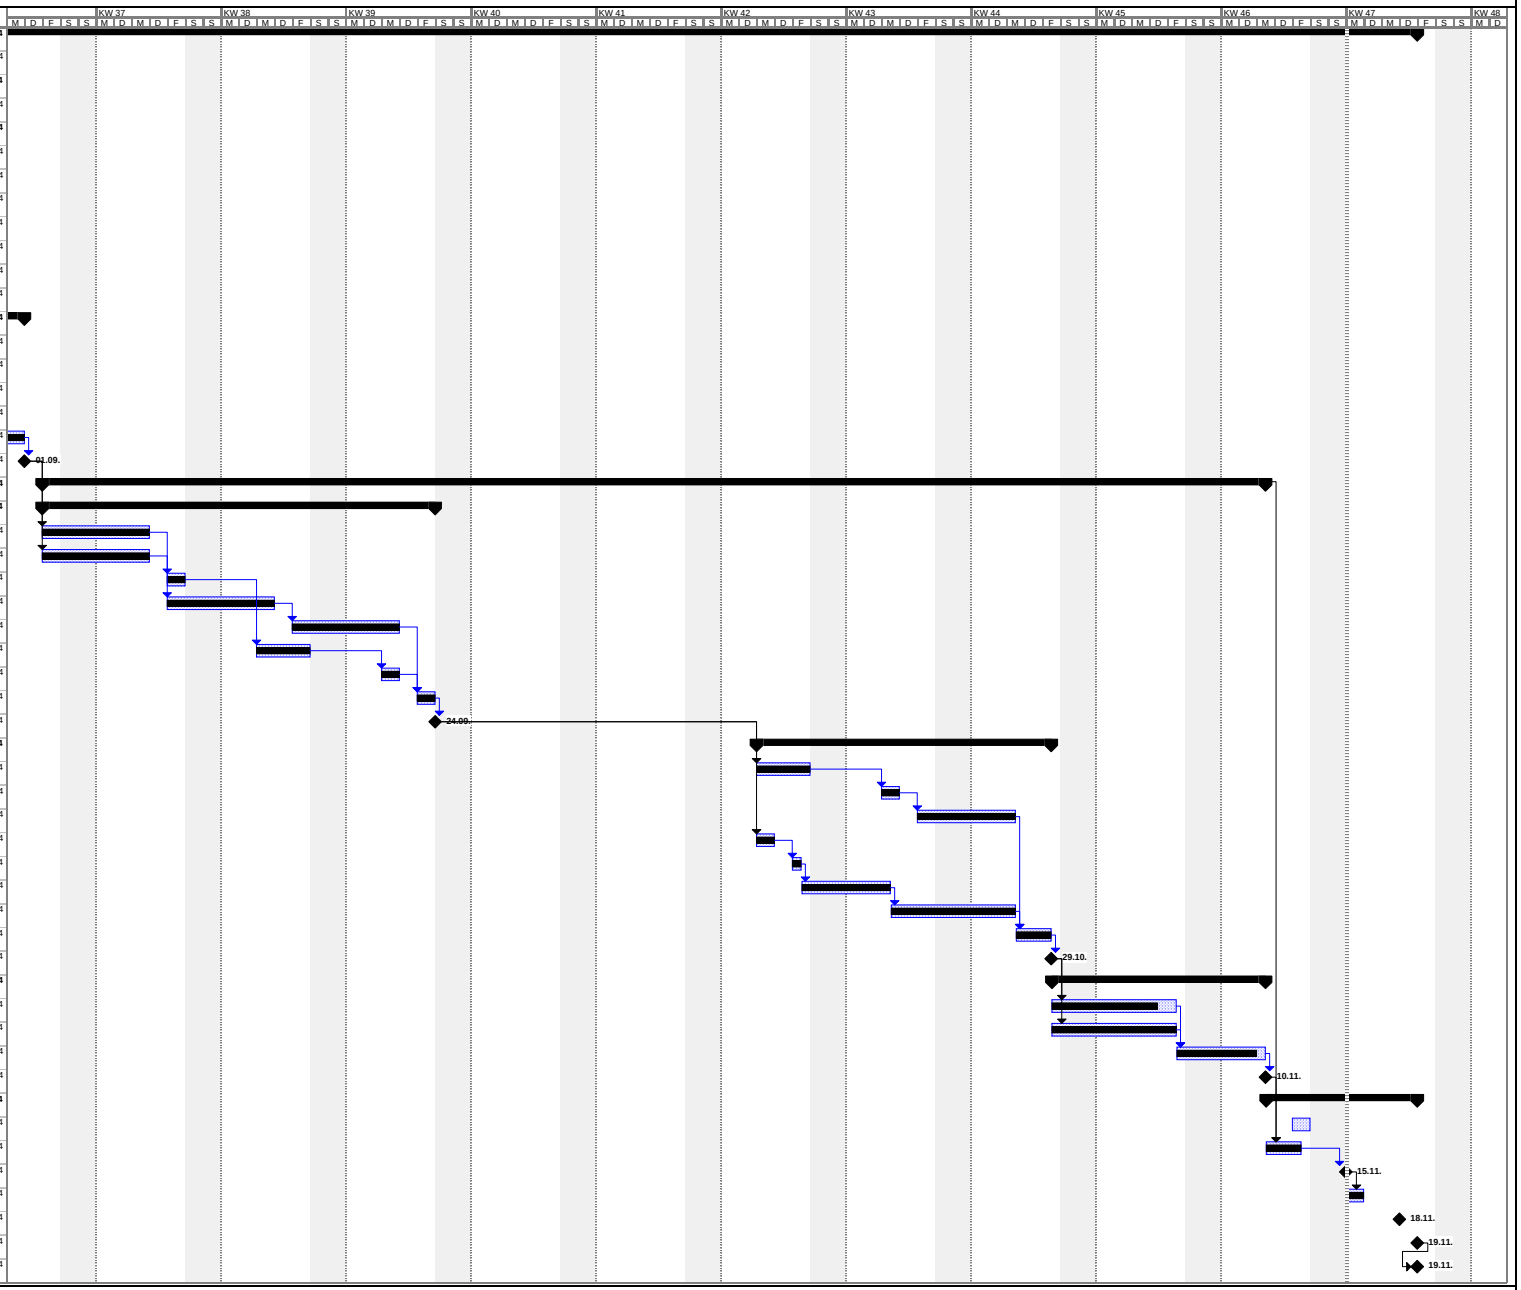

Projekt: eDossier
Datum: Mon 15.11.04

Vorgang | Unterbrechung | In Arbeit | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag
